

足立事業所リニューアル通信

Vol.25



東京団地倉庫
足立事業所

2024年5月発行



各種工事順調に進捗しております！！

足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

・「エレベーター準撤去更新工事」>4期工事となる8B・9C号機は現在、塔内及び機械室の機器撤去・取り付けを実施しております。

・「外部シャッター更新工事」>土日祝にて施工を実施しております。現在13面の本体工事が完了しており、シャッター上の防鳥ネット取付等の付帯工事も並行して実施しております。

・「受電設備改修及び高低圧幹線更新工事」>5/3・4にて北棟東面の道路掘削前のカッター作業を行いました。5/18・19、6/1・2にて道路掘削及び埋設配管敷設、6/15・16にアスファルトの本復旧及びライン引き直し作業を予定しております。

また、北棟東面外壁に幹線ルート配管敷設用の仮設足場を設置致しました。

各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。

ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。

☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ④外部シャッター更新工事
- ⑧受電設備改修及び高低圧幹線更新工事

※番号は計画一覧より


庫内側シャッターボックス(防鳥ネット施工済)



外部シャッター障害物検知装置



北棟東側通路カッター作業

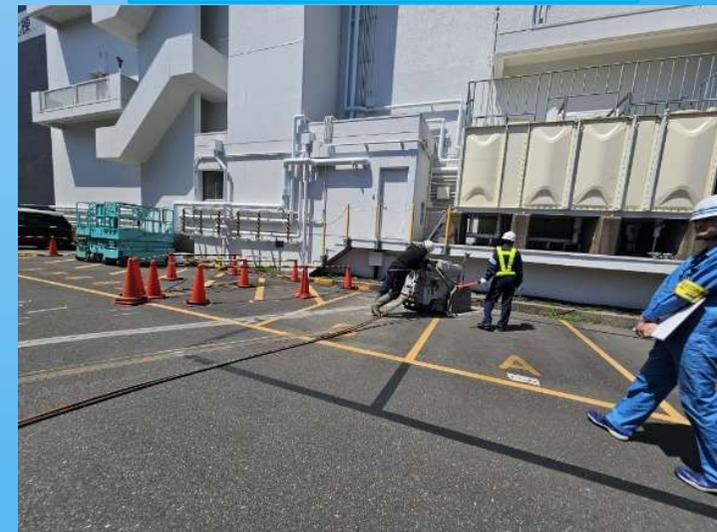

2024年5月17日～2024年6月20日までの工事予定

【南北棟】

件名：受電設備改修及び高低圧
幹線更新工事
場所：南北棟屋上
内容：ケーブルラック・配管設置
作業日：2月上旬～

【南北棟】

件名：外部シャッター更新工事
場所：庫内外部シャッター
内容：外部シャッター更新
作業日：5/18～6/16（土日祝）

【構内】

件名：受電設備改修及び高低圧
幹線更新工事
場所：北棟東面通路
内容：道路掘削
作業日：5/18.19、6/1.2.15.16（予定）

【南棟】

件名：エレベーター準撤去更新工事
場所：庫内・屋上ELV機械室
内容：8-B、9-C（2基同時施工）
作業日：3/16～6/23（予定）

